

Vorbereitung, Planung und Durchführung von Baumaßnahmen der Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn

vereinfachte Darstellung



Kirchenvorstand

Architekt / Fachplaner

Gemeindeverband

Erzb. Generalvikariat

Anlage 1

1.1
KG beantragt Feststellung
Planungs- u. Baubedarf
über den GVB



1.2
GVB sendet Antrag ans EGV



1.4
EGV prüft und entscheidet



1.3 Ortstermin EGV - KG - GVB

1.5
Freigabe nur zur Planung

1.5.1
Beauftragung eines
Architekten / Planers



1.5.2
Erarbeitung Vorplanung
(bzw. gem. Beauftragung)




1.5.3 Termin Ergebnisvorstellung






Antrag auf Baubedarf
für das Ergebnis der Planung

Genehmigung
zur Entwurfsphase

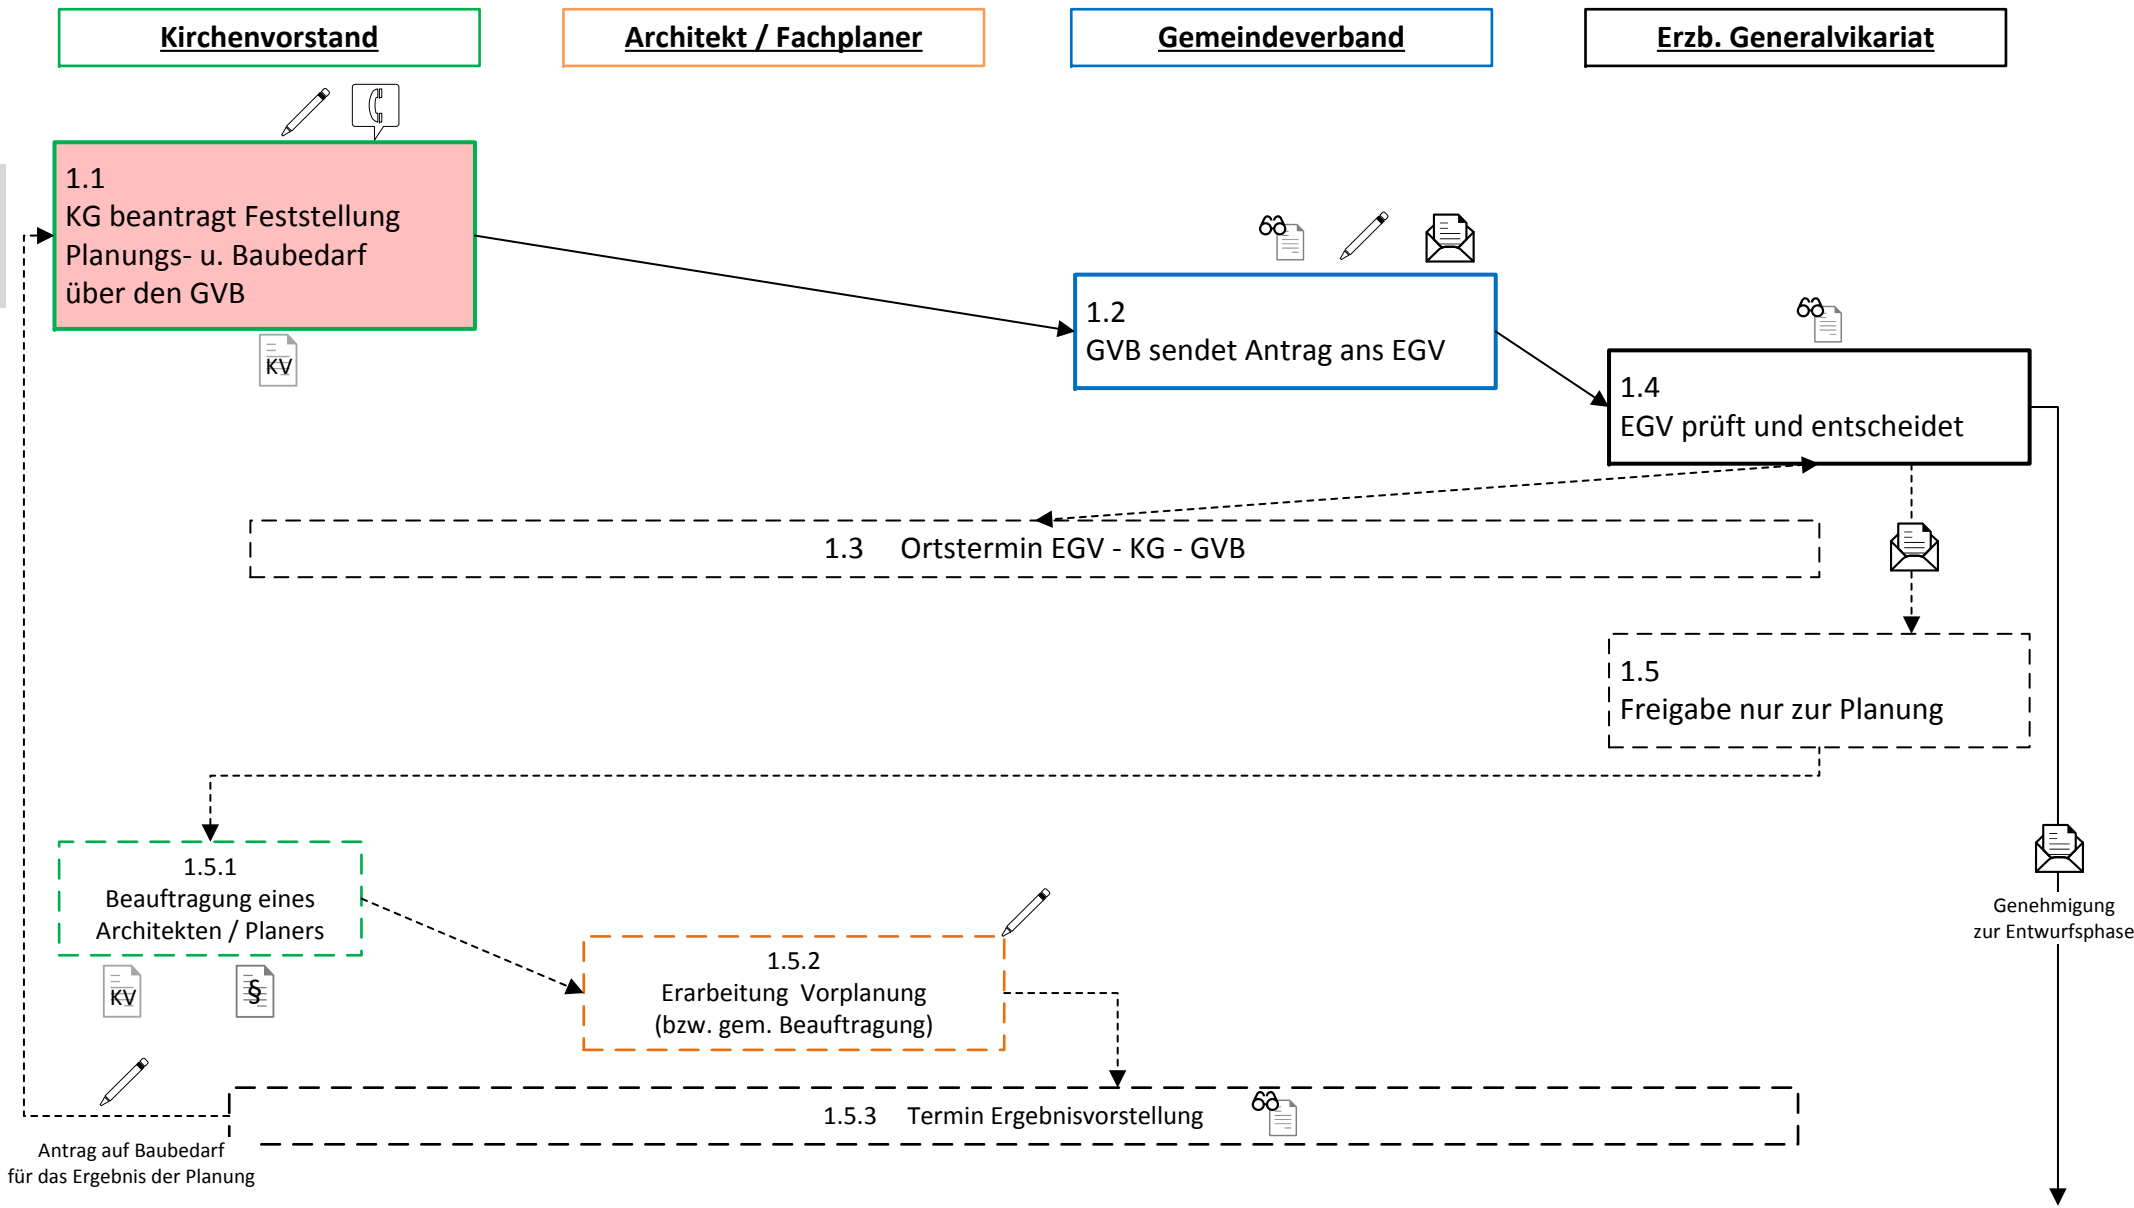


Anlage 2

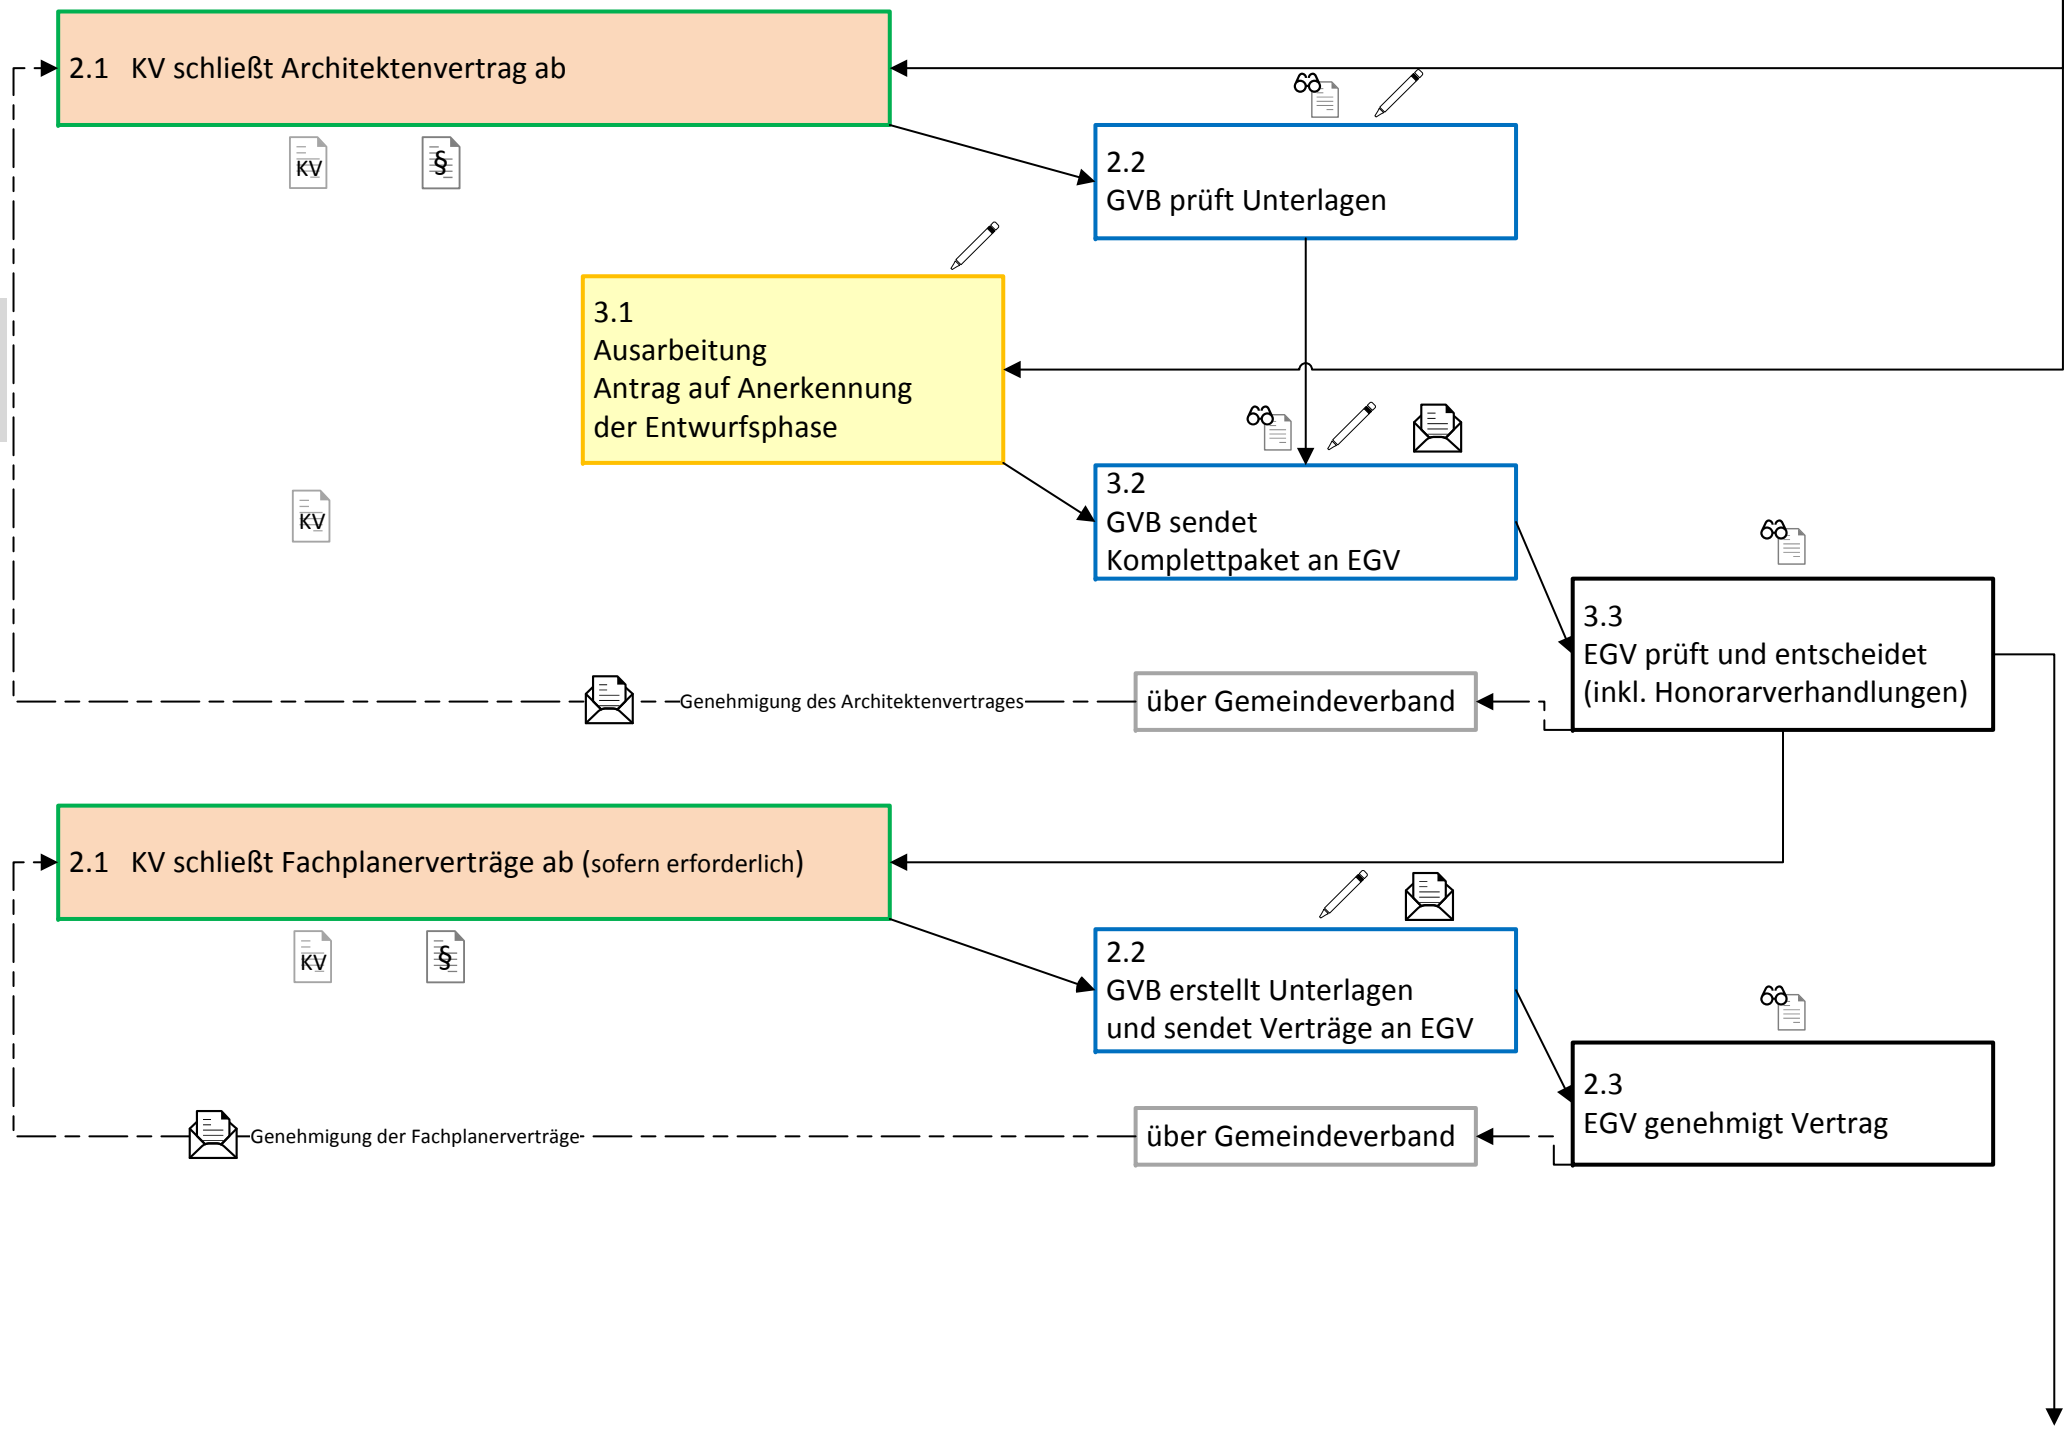

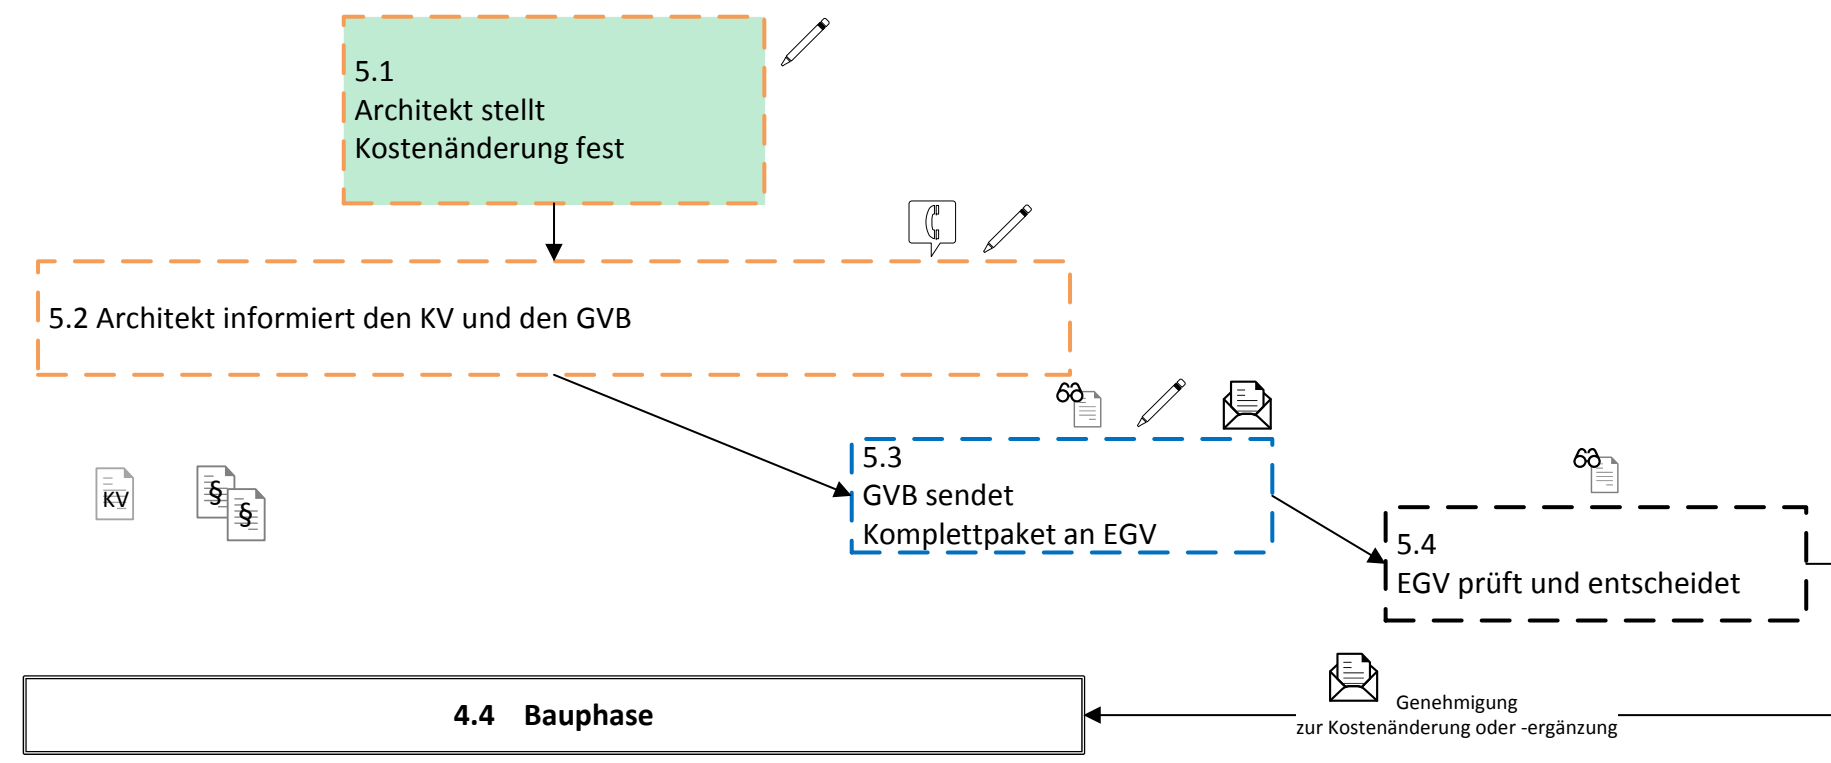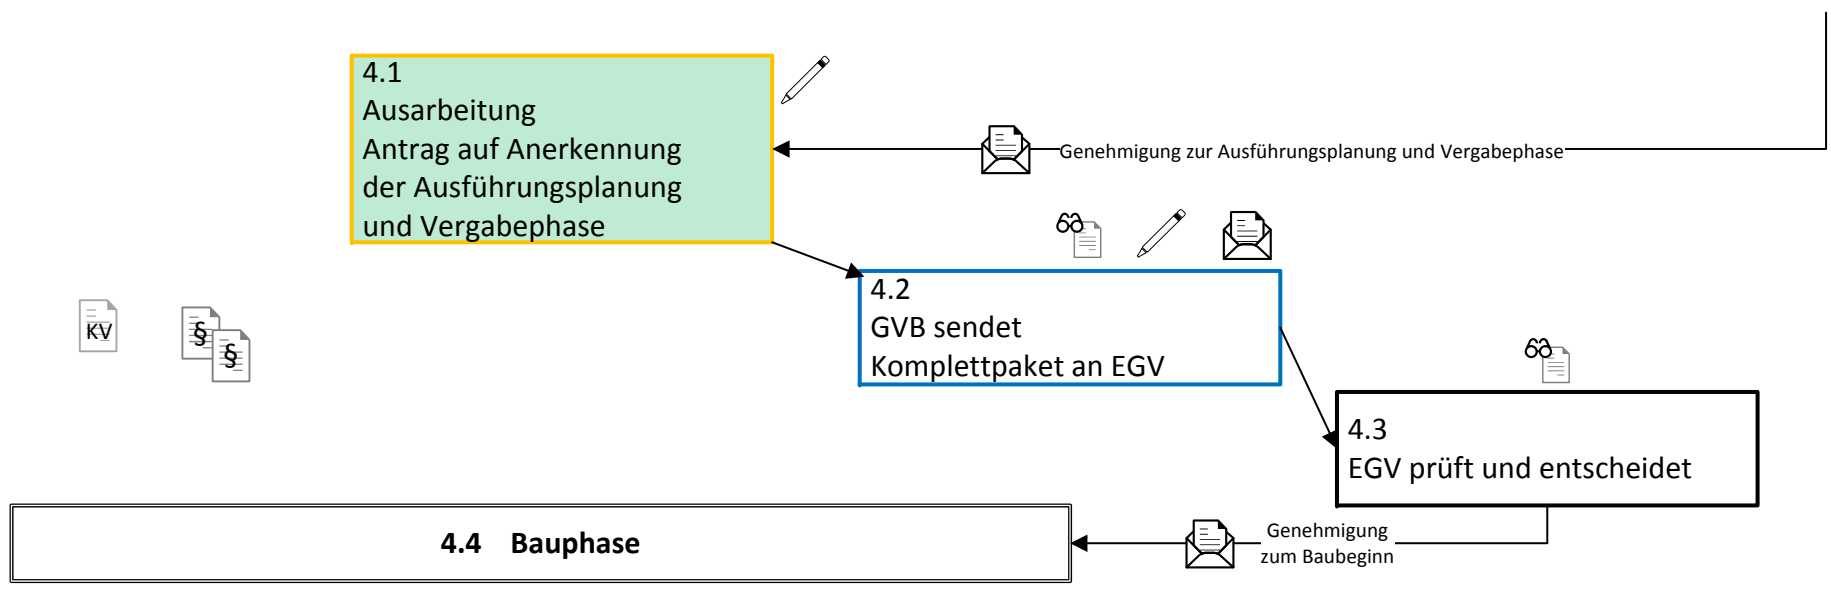

Fertigstellung der Baumaßnahme vor Ort

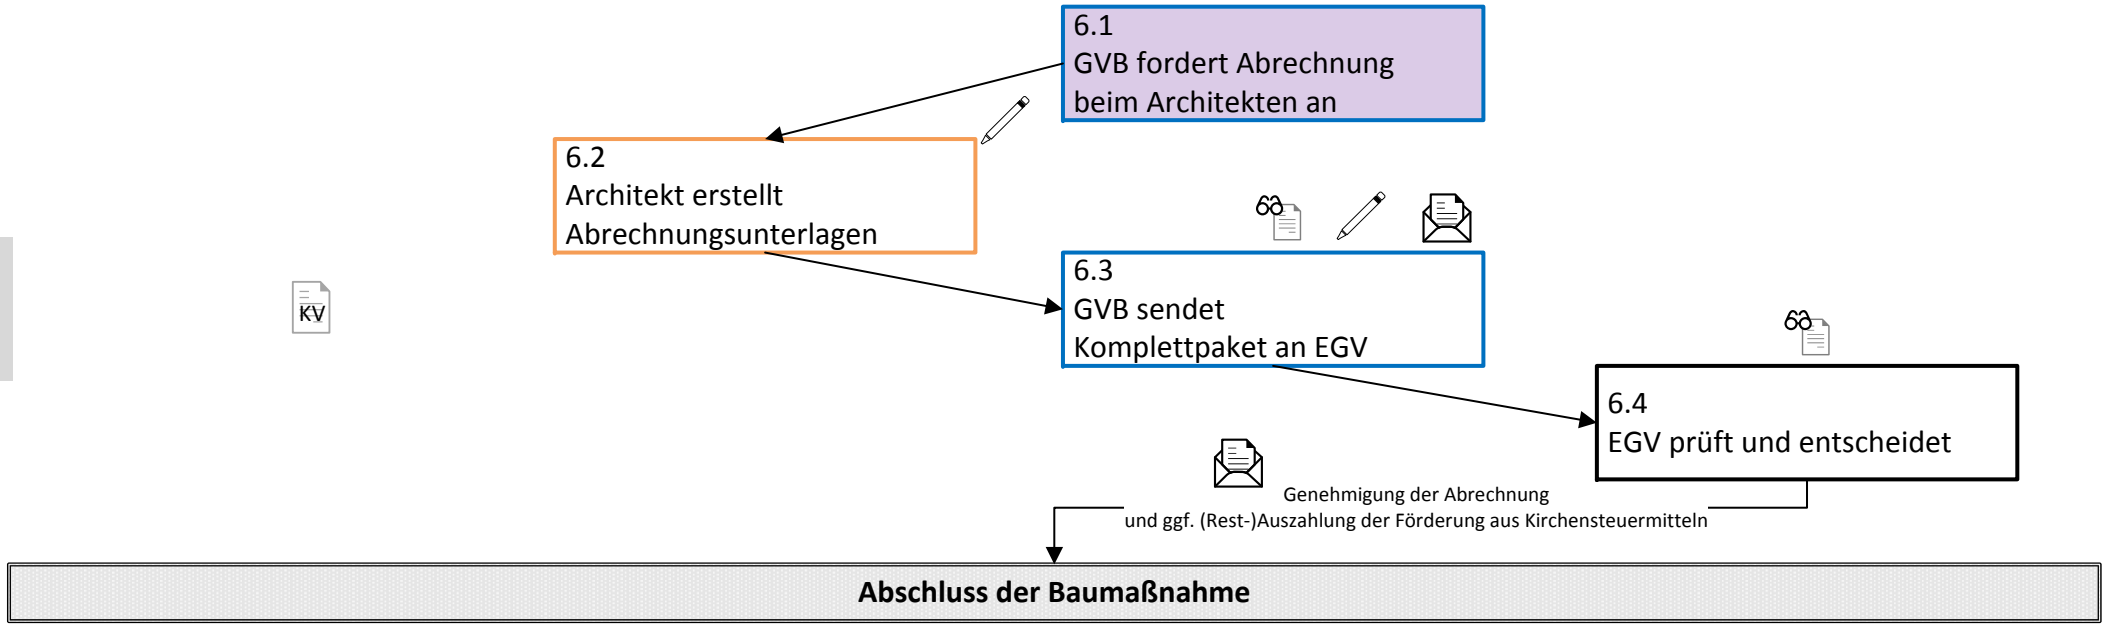

Legende:



Erstellung von Unterlagen,
Information muss weiter gegeben werden



KV-Beschluss (Auszug aus dem Sitzungsbuch)
muss beschlossen / erstellt werden



Prüfung von Unterlagen



Architektenvertrag, Ingenieurvertrag – Fachplaner u.ä.
muss beschlossen / erstellt werden



Erstellung / Ergänzung von Unterlagen



Bauvertrag (früher: Werkvertrag), Bauvertrags-Erweiterung
muss beschlossen / erstellt werden



Antrag wird verschickt,
Antwort / Genehmigung wird schriftlich erteilt
